

Жилой комплекс Gröna Lund, 6 очередь

Фотоотчет о ходе строительства на 25.12.2018.

Корпус 2.4

Полностью окончены работы по монтажу железобетонного каркаса здания.



Начаты работы по устройству вентиляционных шахт на кровле и устройству покрытия кровли.




Начаты работы по монтажу окон и витража лестничного марша.


Начата установка радиаторов отопления.



Начаты работы по инженерным сетям здания. Монтируются коллекторы отопления в МОП.

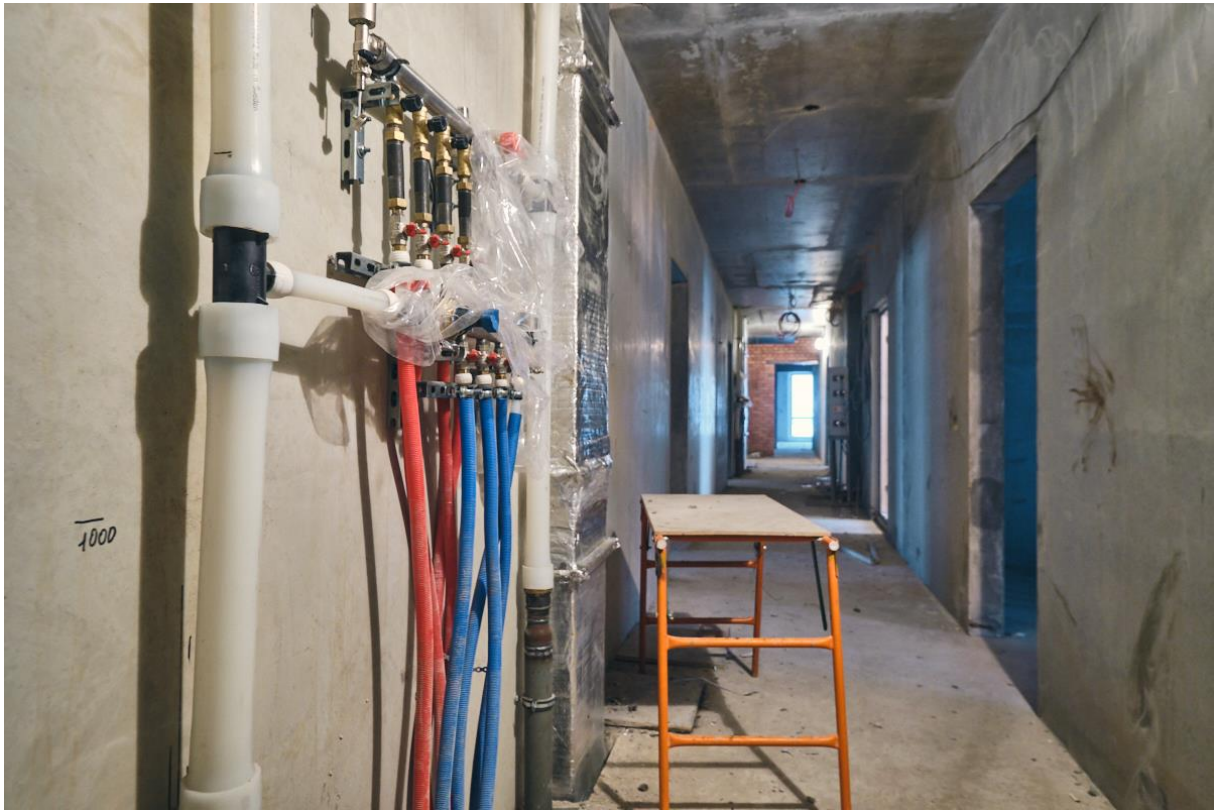

В квартирах корпуса начат монтаж металлокаркаса межкомнатных перегородок из ГКЛ.

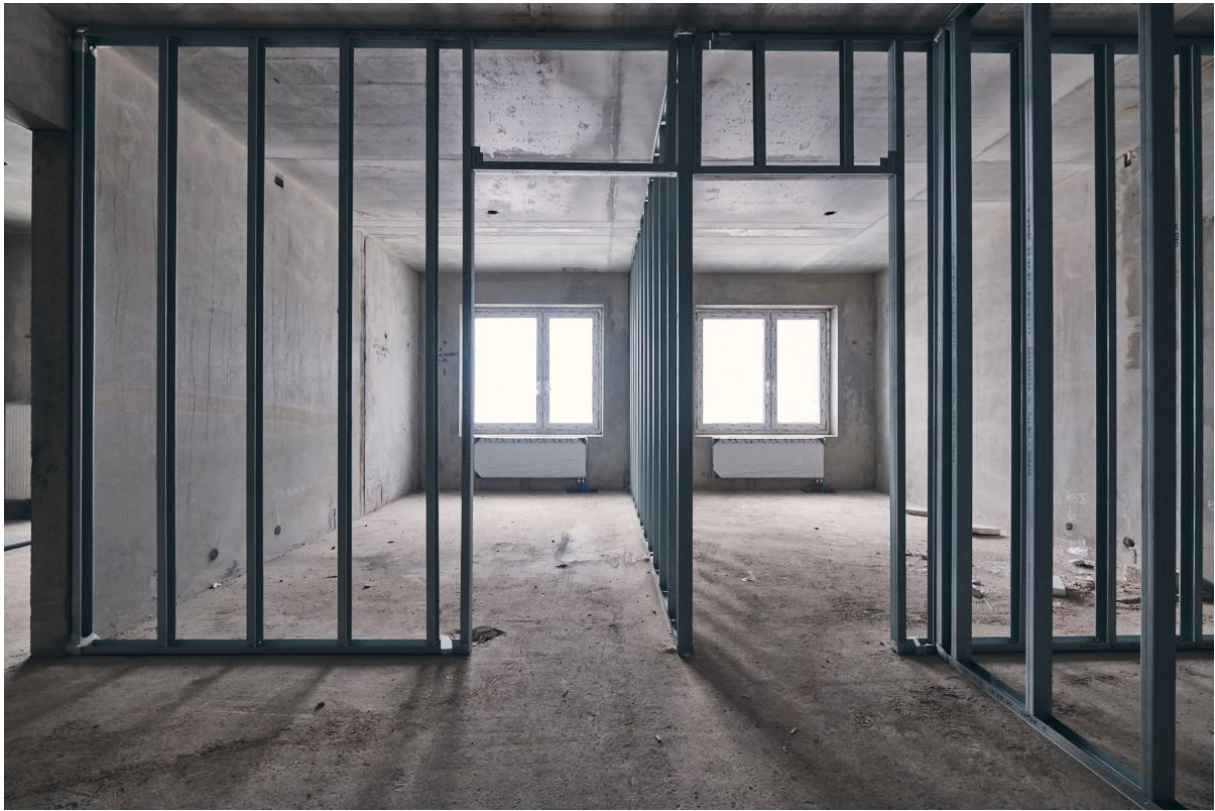

Окончены работы по устройству перегородок кладовых помещений из силикатных блоков в цокольном этаже корпуса.



Корпуса 2.2 и 2.3.

Выполнены фундаментные плиты корпусов.



